

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
COMMUNE DE TAHAR SOUK - PROVINCE DE TAOUNATE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

*TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ EN CHARPENTE
MÉTALLIQUE À TAHAR SOUK*

Entreprise : VIA ATD

Date de fin : 19/09/2025

SOMMAIRE

1. 1. Object du Marché
2. 2. Situation géographique
3. 3. Consistance des travaux exécutés
4. 4. Intervenants
5. 5. Délais
6. 6. État d'avancement final
7. 7. Moyens humains et matériels mobilisés
8. 8. Conclusion et réception des travaux
9. 9. Annexe : photos

1. Objet du marché

Le présent rapport de fin de marché concerne la construction d'un marché de proximité en charpente métallique au centre de la commune de Tahar Souk, province de Taounate.

2. Situation géographique

Le projet est situé au centre de la commune de Tahar Souk, relevant de la province de Taounate, région de Fès-Meknès. Le site est facilement accessible et proche des axes routiers principaux.

3. Consistance des travaux exécutés

Les travaux réalisés dans le cadre du présent marché comprennent :

- Les fouilles en pleine masse et en rigoles,
- Le caniveau avec grille,
- La mise en place du Gros-Béton, béton de propreté et des fondations en béton armé,
- La confection des massifs en béton B25,
- Le dallage en béton légèrement armé,
- La mise en œuvre de la charpente métallique et de la couverture,
- Les travaux de maçonnerie, portes métalliques et finitions.

L'ensemble de ces prestations a été exécuté conformément aux plans et aux prescriptions techniques du cahier des charges.

4. Intervenants

Maître d'Ouvrage : Commune de Tahar Souk

Bureau d'Études : CEA INGENIERIE

Entreprise : VIA ADT

Laboratoire de Contrôle : Labotest

5. Délais

Le délai contractuel d'exécution des travaux était fixé à trois (3) mois selon les stipulations du marché.

Cependant, les travaux ont été achevés en quatre (4) mois, soit un (1) mois de retard par rapport au délai initial.

Ce retard est principalement dû à des contraintes logistiques et de coordination, sans impact majeur sur la qualité ni la conformité de l'ouvrage.

6. État d'avancement final

L'ensemble des prestations prévues au marché ont été exécutées conformément aux documents contractuels. L'état d'avancement physique est de 100% et les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire sans réserves majeures.

Taux d'avancement physique : 100%

7. Moyens humains et matériels mobilisés

Moyens humains :

- 1 Conducteur des travaux
- 1 Chef de chantier
- 2 Chefs d'équipe
- 10 Ouvriers

Moyens matériels :

- 1 Pelles
- 1 Camion benne
- 1 Compacteur
- 1 Bétonnière
- 1 Poste à souder
- Outilage de maçonnerie et coffrage

8. Conclusion et réception des travaux

Les travaux du projet de construction du marché de proximité en charpente métallique à Tahar Souk sont entièrement achevés. L'entreprise VIA ADT a respecté les prescriptions techniques, les délais et les normes de qualité exigées. Le projet est désormais prêt à être mis en service au bénéfice de la population locale.

9. Annexe : Rapport photo final

Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7

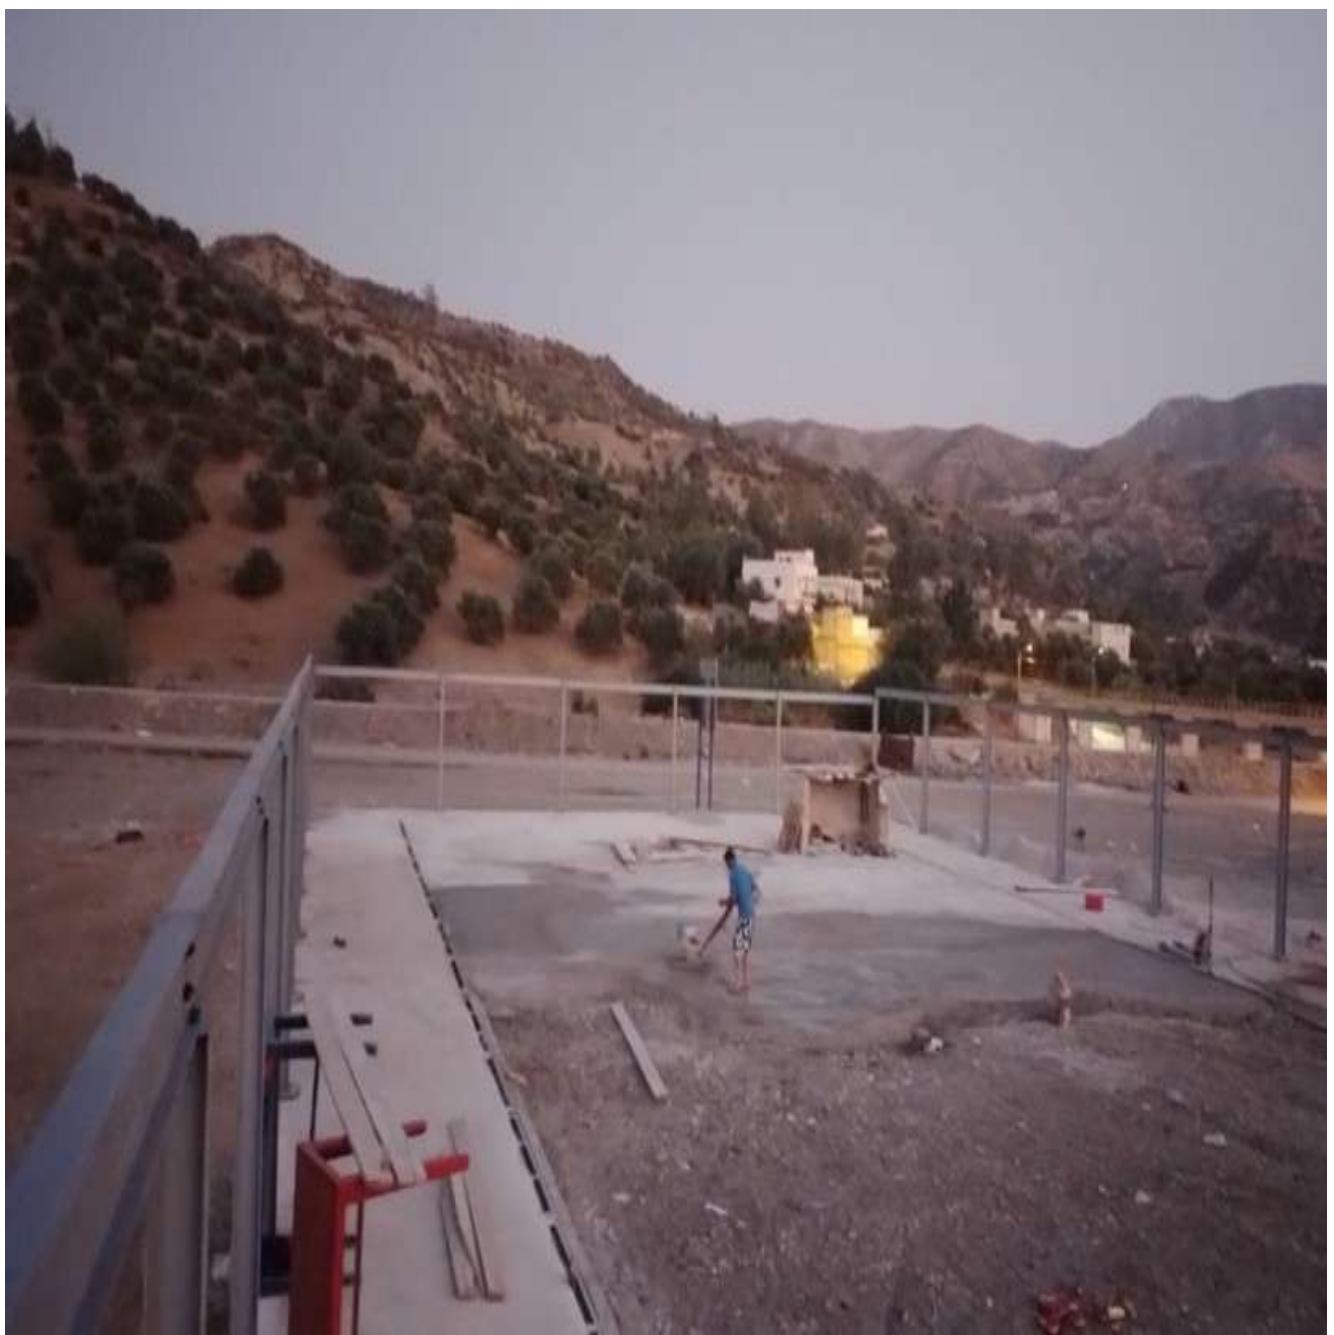


Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12

